



## Enfotek Süreç Plan Modülü ile iş adımlarınız kontrol altında!



Enfotek ERP ve Yazılım Çözümleri Süreç Plan Modülü profesyonel ERP kullanıcılarına iş süreçlerinin yönetiminde birçok kolaylık sağlıyor.

- İş süreçlerini varyant, ülke, termin vb. detay bazında adım adım planlayabilirsiniz.
- Hedef süre ve terminlerin her bir iş adımı için otomatik hesaplanmasını, olası gecikmelerin önceden tespitini ve giderilmesini sağlayabilirsiniz.
- Süreclere yönelik kısıtların önceden tespitini yapabilirsiniz.
- Süreç sorumlularına hedef termin duyurularının otomatik bildirim olarak gönderilmesini ve kolay süreç takibini yapabilirsiniz.
- Sürece uyum performansı, süreç gecikme analizi, süreç performansı ve süreç maliyeti gibi rasyoların anlık ve güvenilir raporlanmasını yapabilirsiniz.
- İş veriminin kaynak ve süreç bazlı artırılmasını sağlayabilirsiniz.



SÜREÇ PLAN FAYDALARI



 Enfotek

# SÜREÇ PLAN



Ürün ve siparişin özelliklerine göre farklı süreçlerden oluşan **süreç planlar** oluşturulabilirsiniz.



Her bir süreç adımı için farklı bir mesai ve **çalışma takvimi** opsiyonu belirleyebilirsiniz.



Ulusal ve dini bayramlar gibi tatil günlerini takvimde **kolaylıkla** tanımlayabilirsiniz.

**SÜREÇ PLAN ÖZELLİKLERİ**



## KOLAY İZLENEBİLİRLİK

Süreç planlarınızı **ileri bir tarihe** öteleyebilirsiniz.

Her bir süreç adımının öncül süreçlerin gerçekleşme koşullarına göre ardıl süreçlerin başlangıçları tanımlayabilirsiniz.



Tamamlanan iş süreçlerinin tamamlanma durumlarına göre ardıl süreçlerin başlangıç tarihlerinin **otomatik** revizyonunu sağlayabilirsiniz.

Gerçekleşen iş süreçlerinin otomatik gerçekleşme tarihlerinin süreç plan üzerine aktarımını sağlar.



**Enfotek**

## ENFOTEK ERP VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ SÜREÇ PLAN MODÜLÜ

Müşteri siparişlerinin iş adımlarının süreç yönetimi, numune- prototip üretimlerin iş adımlarının süreç yönetimi, kurumsal gelişim projelerinin süreç yönetimi için kullanılabilir.

Genel			Detay															
Sipariş No	Model	Plan Termini	Sipariş Girişi Gerçekleşen Bit. Tar.	PPS Onayı Gerçekleşen Bit. Tar.	Kumaş Planlama Gerçekleşen Bit. Tar.	Dikim Aksesuar Planlama Gerçekleşen Bit. Tar.	Paket Aksesuar Planlama Gerçekleşen Bit. Tar.	Kumaş Tedarik Gerçekleşen Bit. Tar.	Dikim Aksesuar Tedarik Gerçekleşen Bit. Tar.	Paket Aksesuar Tedarik Gerçekleşen Bit. Tar.	Çekme Testi ve Gruplama Gerçekleşen Bit. Tar.	Kumaş Açma Gerçekleşen Bit. Tar.	Kalıp Hazırlık Gerçekleşen Bit. Tar.	Pastal Hazırlık Gerçekleşen Bit. Tar.	Kesim Gerçekleşen Bit. Tar.	Dikim Gerçekleşen Bit. Tar.	Yıkama Partisi Gerçekleşen Bit. Tar.	
9892																		
9892	surec test	29.09.2023	23.06.2023 13:47:33	23.06.2023 13:47:37	23.06.2023 13:47:15	23.06.2023 13:46:50	23.06.2023 13:46:50	3.07.2023 15:03:02	3.07.2023 15:09:58	3.07.2023 15:10:25			3.07.2023 14:45:26	3.07.2023 14:45:36		3.07.2023 10:05:06	3.07.2023 09:45:23	

(SIPARIS.SIPARIS\_NO'ya '%9892%')

1 Kayıt

Index	İşlem Adı	Teorik Süre	Soutputd...	Perf	Süre	Plan Başla	Plan Bitiş	Onay	İş Emri	Pmtasks Id	Önceki İşler	Sonraki İşler	Kütük İşlem	Takvim	Revizyon Sayısı
0	9892 - 100 BLACK				57d	23.06.2023 12:	12.09.2023 13:	<input type="checkbox"/>		3.565					
1	Sipariş Girişi				1d	23.06.2023 12:	26.06.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.566		3567; 3573SS	Sipariş Girişi		
2	PPS Onayı				12d	26.06.2023 13:	12.07.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.567	3566	3569; 3570; 3573	PPS Onayı		
3	Kumaş Planlama				2d	23.06.2023 12:	27.06.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.568			Kumaş Planlar		
4	Dikim Aksesuar Planlama				2d	12.07.2023 13:	14.07.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.569	3567	3571SS	Dikim Aksesuar		
5	Paket Aksesuar Planlama				2d	12.07.2023 13:	14.07.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.570	3567	3572SS	Paket Aksesuar		
6	Dikim Aksesuar Tedarik				7d	12.07.2023 13:	21.07.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.571	3569SS	3582	Dikim Aksesuar		
7	Paket Aksesuar Tedarik				7d	12.07.2023 13:	21.07.2023 13:	<input type="checkbox"/>	False	3.572	3570SS	3590	Paket Aksesuar		
8	Kumaş Tedarik		23d		28d	23.06.2023 13:	2.08.2023 13:0	<input type="checkbox"/>	False	3.573	3566SS; 3567	3574OS; 3575	Kumaş Tedarik		
9	Çekme Testi ve Gruplama				5d	26.07.2023 13:	2.08.2023 13:0	<input type="checkbox"/>	False	3.574	3573OS	3576SS	Çekme Testi ve		
10	Kumaş Açma				2d	2.08.2023 13:0	4.08.2023 13:0	<input type="checkbox"/>	False	3.575	3573	3577	Kumaş Açma		
11	Kalıp Hazırlık				7d	26.07.2023 13:	4.08.2023 13:0	<input type="checkbox"/>	False	3.576	3574SS	3577	Kalıp Hazırlık		
12	Pastal Hazırlık				1d	4.08.2023 13:0	7.08.2023 13:0	<input type="checkbox"/>	False	3.577	3575; 3576	3578	Pastal Hazırlık		
13	Kesim		5d		3d	7.08.2023 13:0	10.08.2023 13:0	<input type="checkbox"/>	False	3.578	3577	3579OS; 3580OS; 3	Kesim		


21 kayıt;

Genel								Detay									
Sipariş No	Model	Plan Termini	Sipariş Giriş	PPS Onay	Kumaş Planlama	Dikim Aksesuar Plan	Paket Aksesuar Plan	Dikim Aksesuar Tedarik	Paket Aksesuar Tedarik	Kumaş Tedarik	Ç.T. ve Gruplama	Kumaş Ağma	Kalıp Hazırlık	Pastal Hazırlık	Kesim	Dikim	Yıkama Te Partisi

Filtre tanımlamak için buraya tıklayınız

10015	Yeni Eğitim Model	25.10.2023	18.07.2023 13:00:00	3.08.2023 13:00:00	21.07.2023 13:00:00	07.08.2023	7.08.2023 13:00:00	14.08.2023	14.08.2023 13:00:00	24.08.2023 13:00:00	24.08.2023 13:00:00	28.08.2023 13:00:00	28.08.2023 13:00:00	29.08.2023 13:00:00	1.09.2023 13:00:00	15.09.2023 17:37:30	15.09.2023 17:37:30
-------	-------------------	------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------	-----------------------	------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

771 Kayıt

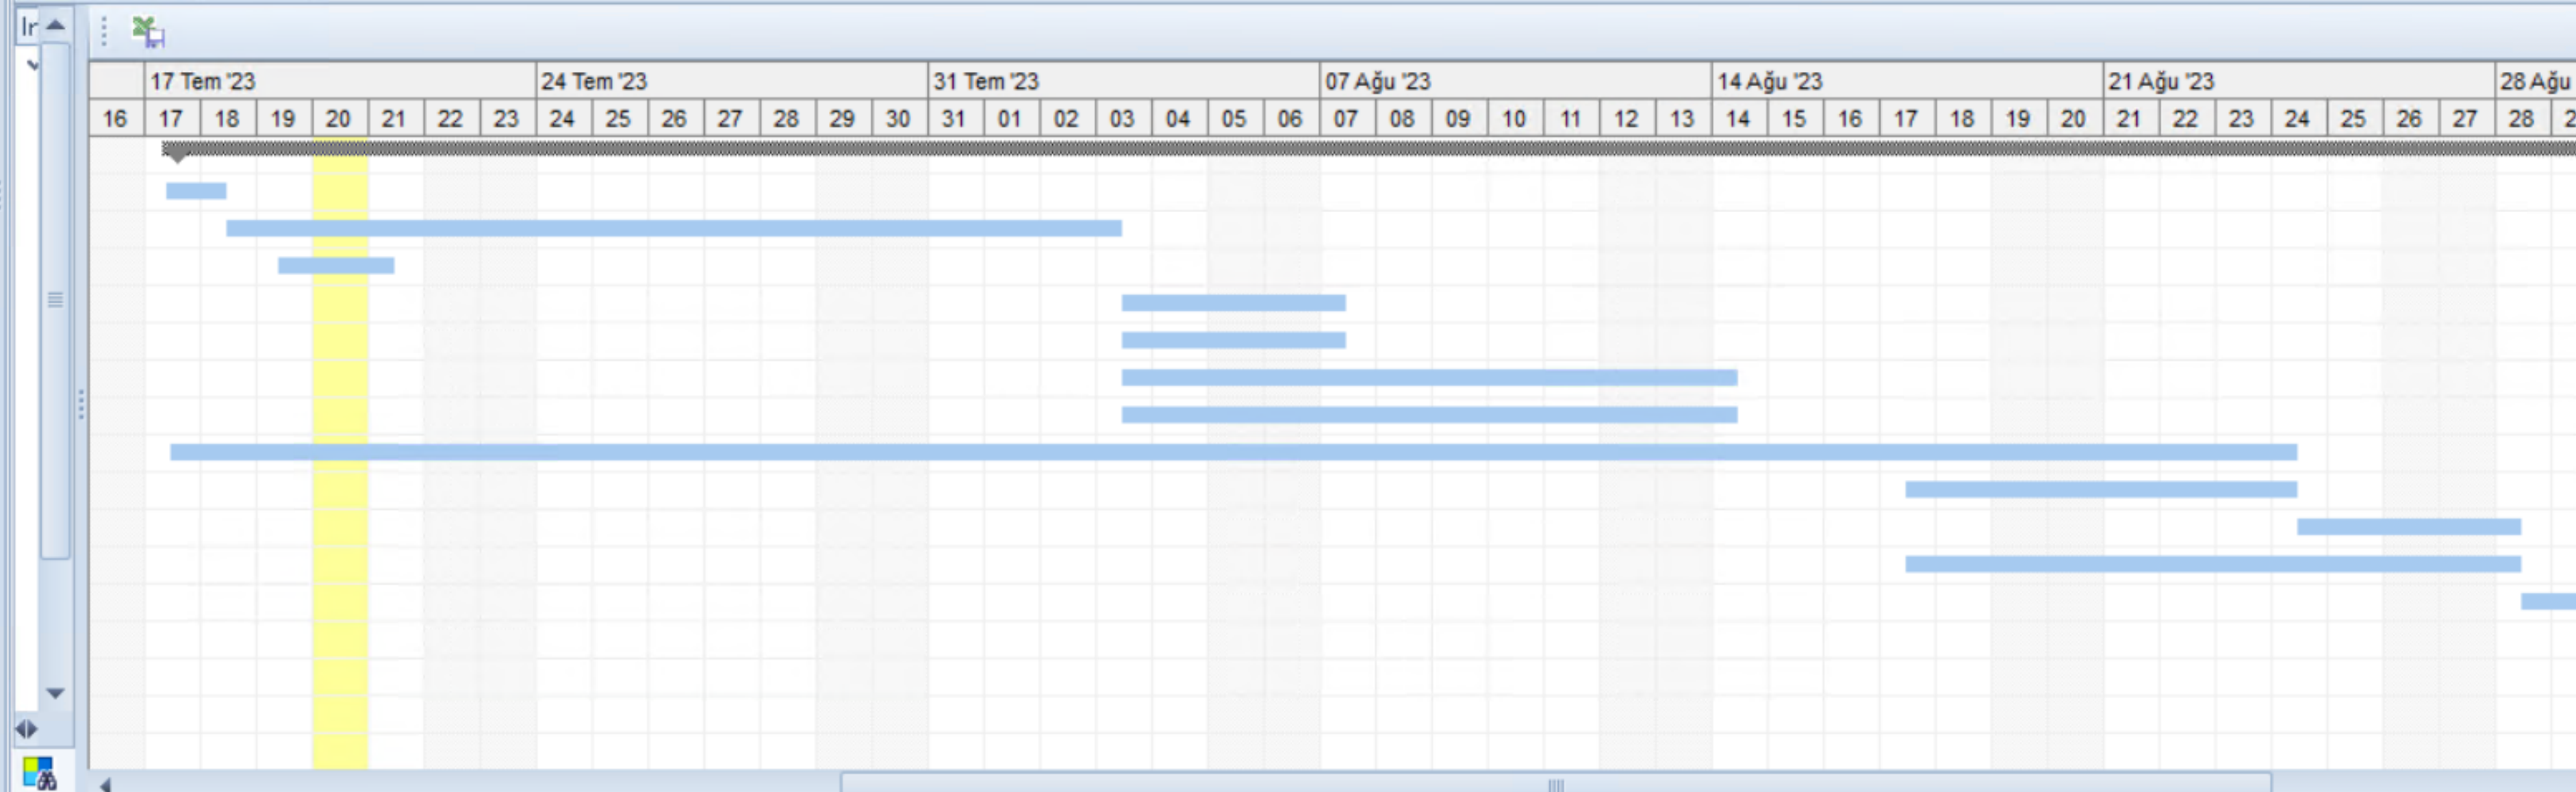

Görevler

Varsayılan Kaynak Bağı

SIPARISID	İşlem Adı	Sahip	Sduration	Planstart	Plan Finish	Plan Hafta	Açıklama	Planlama Notu	Tam. Durum	Tamamlayan Per.	Teslim Tarihi
-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	------------	----------	---------------	------------	-----------------	---------------

Filtre tanımlamak için buraya tıklayınız

8.831	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.795	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.798	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.833	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.810	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.832	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.805	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 13:00:00	2023-07					
8.807	Sipariş Girişi	Müşteri Temsilcileri	1.33d	15.02.2023 12:00:00	16.02.2023 16:08:15	2023-07					
8.832	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	2d	20.02.2023 13:00:00	22.02.2023 13:00:00	2023-08					
8.831	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	2d	20.02.2023 13:00:00	22.02.2023 13:00:00	2023-08					
8.810	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	8.33d	15.02.2023 13:00:00	1.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.798	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	10d	15.02.2023 13:00:00	1.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.807	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	13.33d	15.02.2023 13:00:00	1.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.810	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	10d	16.02.2023 13:00:00	2.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.833	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	12d	16.02.2023 13:00:00	6.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.831	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	12d	16.02.2023 13:00:00	6.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.795	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	12d	16.02.2023 13:00:00	6.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.832	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	12d	16.02.2023 13:00:00	6.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.805	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	12d	16.02.2023 13:00:00	6.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.807	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	20d	15.02.2023 13:00:00	8.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.798	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	15d	15.02.2023 13:00:00	8.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.810	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	12.5d	15.02.2023 13:00:00	8.03.2023 13:00:00	2023-07					
8.831	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	2d	8.03.2023 13:00:00	10.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.832	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	2d	8.03.2023 13:00:00	10.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.807	PPS Onayı	Müşteri Temsilcileri	16d	16.02.2023 16:08:15	10.03.2023 16:08:14	2023-07					
8.805	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	7d	6.03.2023 13:00:00	15.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.805	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	7d	6.03.2023 13:00:00	15.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.795	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	7d	6.03.2023 13:00:00	15.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.795	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	7d	6.03.2023 13:00:00	15.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.833	Dikim Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	7d	6.03.2023 13:00:00	15.03.2023 13:00:00	2023-10					
8.833	Paket Aksesuar Tedarik	Aksesuar Satınalma	7d	6.03.2023 13:00:00	15.03.2023 13:00:00	2023-10					
